


高島橋架け替え工事の進捗と今後のお知らせ


現在、高島橋架け替え工事において、橋の下部工（橋台）を造るために必要な地盤改良工事が完了し、下部工（橋台）工事と上部工の工場製作を行っております。

● 現在契約中の工事

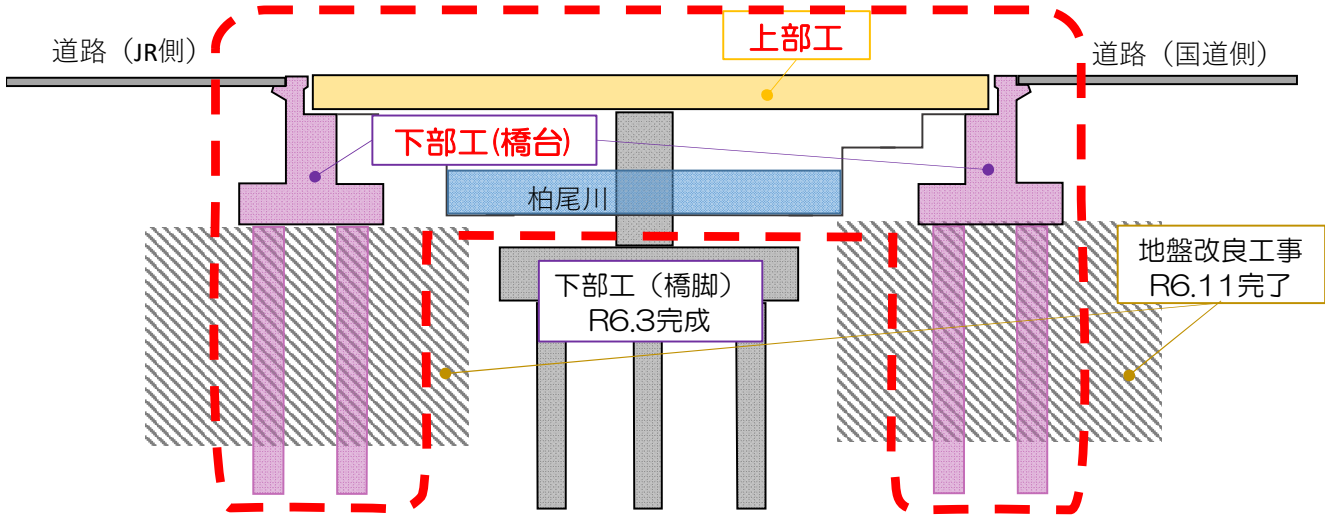

● 現在の状況

令和7年度中の開通を目指し工事を進めておりましたが、地盤改良の圧力によって、改良範囲を囲う鋼材（仮締切）が川側に押され、隣接する仮設の作業ステージにおいて、安全性を確保する必要が生じました。これまで、安全性確保のために、施工業者と協議・調整を重ね、対策案を講じておりました。なお、陸側（民地）における影響は生じておらず、安全であることを確認しています。

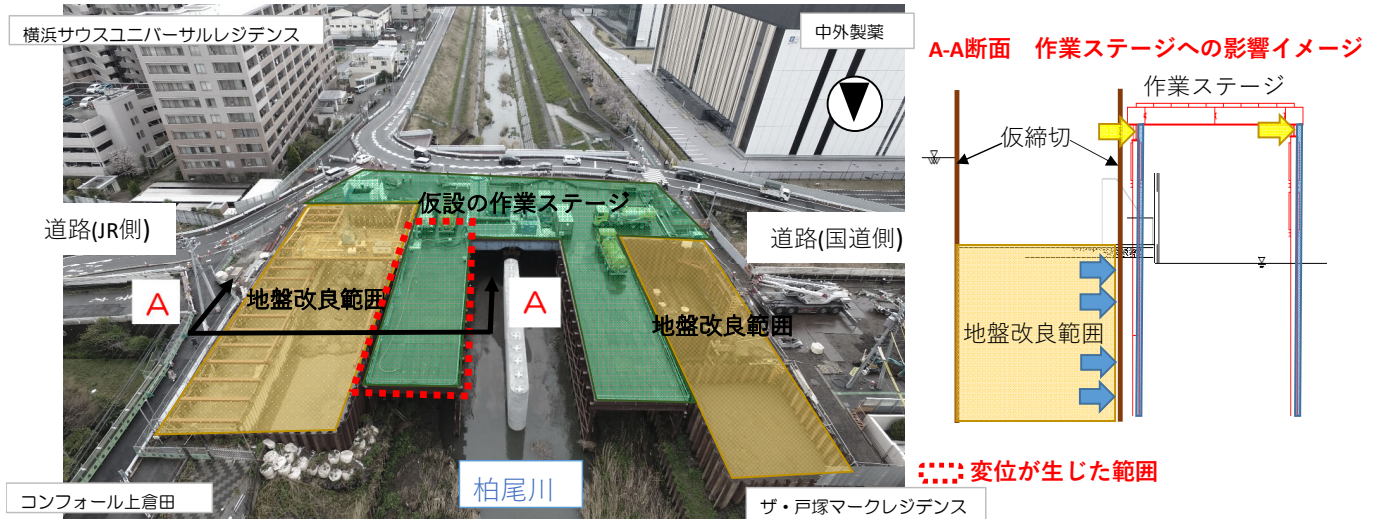

● 今後の予定

今後、作業ステージを修復し、橋台を完成させ、上部工の架設を行い、令和8年度内の完成を目指して進めてまいります。皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、1日でも早く完成できるよう、最善を尽くして取り組んでまいります。

引き続き、事業へのご理解・ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

横浜市 道路局 建設部 建設課 田中・二宮・花村・平賀

TEL : 045-671-3539 / FAX : 045-663-8993 / E-mail : do-kensetsu@city.yokohama.jp
