

市第131号議案 平成23年度横浜市一般会計補正予算（第6号）
（資源循環局関係部分）（繰越明許費補正）について

平成24年2月16日
温暖化対策・環境創造・資源循環委員会資料
資源循環局

戸塚区品濃町最終処分場対策事業のうち、平成23年度の改善工事について今年度内での工事完了が困難であることが見込まれることから、繰越措置を講じることとするものです。

1 平成23年度工事の概要

- (1) 施工目的：急傾斜に積上げられた埋立廃棄物の崩落防止
- (2) 施工内容：
 - ①擁壁の設置 延長約59m
(高さ約10m 直径4m×8本、その他大型ブロック)
 - ②廃棄物の整形 約42,000m³

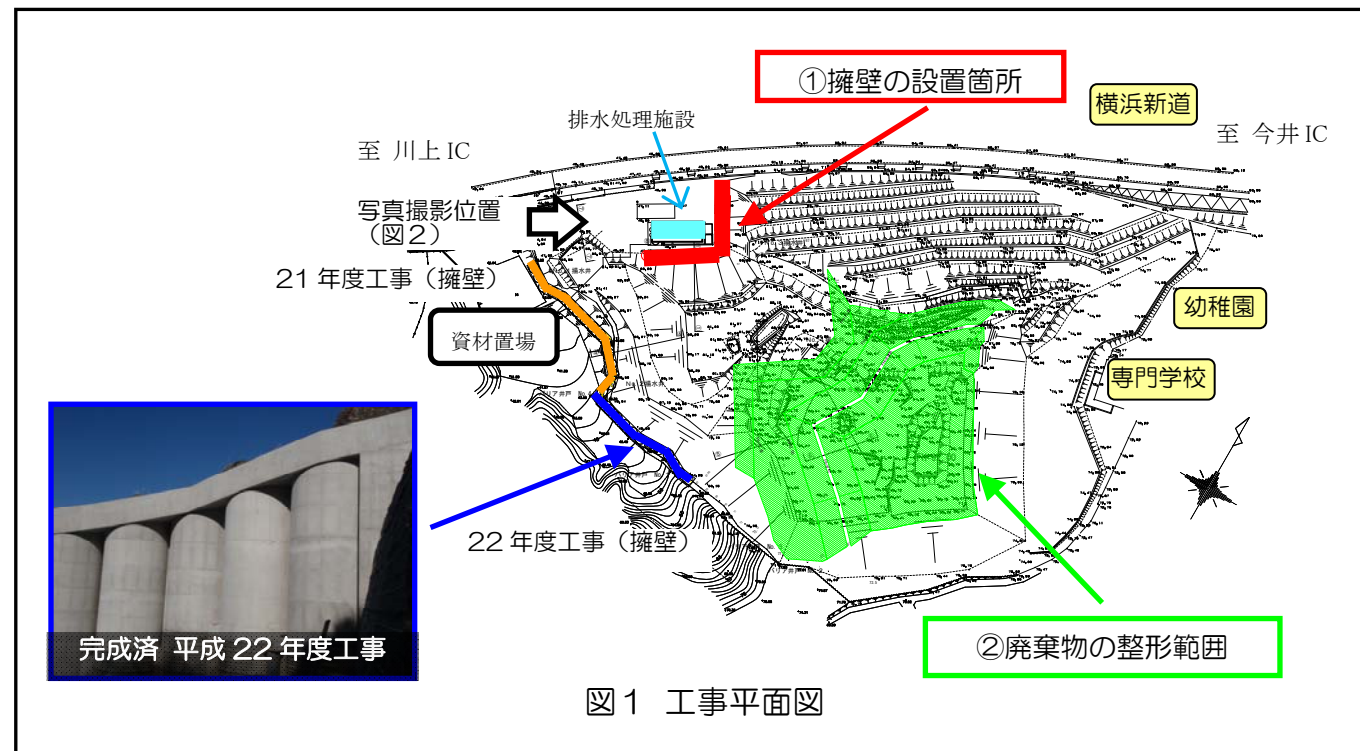


図1 工事平面図



図2 擁壁の設置箇所（写真）

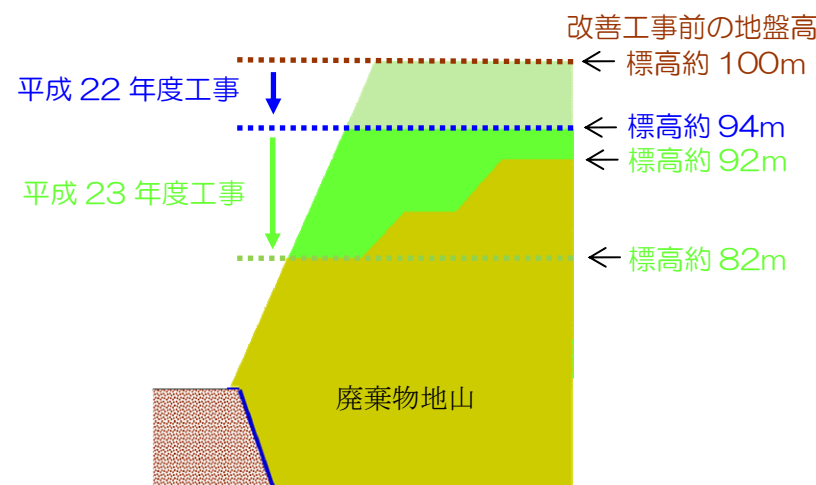


図3 廃棄物整形イメージ

2 繰越理由

(1) 擁壁設置工事

当該処分場は、施工用地が狭いことから資材置き場の確保等が難しく、平成23年度工事を施工するためには、平成22年度工事が完了している必要があります。

しかし、平成22年度工事において、擁壁施工箇所の埋立廃棄物層が想定に比べて厚い等の理由から掘削に日時を要し、工事の完了が遅れたことから、平成23年度の擁壁設置工事の着工が1月に遅延したためです。

(2) 廃棄物整形工事

平成23年度工事において、廃棄物の掘削を開始したところ、廃棄物地盤が予想以上に硬く締め固まっていることから、掘削工程に遅れが生じているためです。

3 繰越期間

平成22年度工事の遅れによる擁壁工事の着工の遅れと、廃棄物整形工事の工期延長に伴い、工程を見直した結果、片付けを含めて6か月遅れ、工事の完了は平成24年9月となる見通しです。

表1 スケジュール

	平成23年			平成24年									
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
準備工事・片付け													
擁壁設置工事（仮施設工ヤード設置）													
擁壁設置工事（擁壁本体の設置）													
廃棄物整形工事													

— : 平成22年度工事 — : 平成23年度工事（繰越対象工事）
破線は当初予定、実線は現状（見込みを含む）のスケジュールを示します。

4 繰越明許費

平成23年度末には、平成23年度工事全体の30%程度が完了しているものと見込まれ、平成24年4月以降の工事費（残り約70%部分）を繰越明許費とし、補正を行います。

表2 繰越明許費

項目	工事金額
平成23年度工事 工事費	409 百万円
平成23年度執行予定額	127 百万円
平成24年度執行予定額（繰越明許費）	282 百万円
